



धुर्कोट गाउँपालिका



गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बर्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन १६ श्रावण २०८०,

प्रस्तोता:

खड्क बहादुर थापा (अधिकृत)

योजना कार्यान्वयनको अवस्था

- कुल आयोजना संख्या : ४८६
- उपभोक्ता समिति तर्फ सम्पन्न :- ४५३
- ठेक्का तथा कोटेसन मार्फत सम्पन्न :- ३६
- कुल सम्पन्न संख्या :- ४८९
- कार्यान्वयनमा रहेका संख्या :- ७ (ठेक्का प्रकृयाका)

निकासा खर्च अवस्था

- उपभोक्ता समिति तर्फ :- रु. ११,४१,७०,८४४।
- ठेक्का तर्फका रनिँ, तथा अन्तिम भुक्तानी खर्च
- रु. ७,५४,८४,४३८।
- कुल खर्च रकम रु. १८,९६,६५,३८३।
- जसमध्ये ३ वटा योजनाको रकम आभावका कारण भुक्तानी बाँकी रु.:- २४,३२,५४६।-

उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन भएका रु १० लाख भन्दा माथीका योजनाको विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजन रु.	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.
१	इन्दिरा मा.वि.भवन निर्माण	५००००००	४९९९६२७
२	निन्नुखर्क मा.वि.भवन निर्माण	५००००००	४९८८३३४
३	गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी योजना वडा नं. १-७	४५०००००	४०४६१६४
४	ज्ञानोदय मा.वि.२ कोठे भवन निर्माण	२५०००००	२४८६९८४
५	बोम बहादुर टोमलाल स्मृती भवन निर्माण	१५०००००	१५०००००
६	नागधारे खुर्पाखोला झो.पु.	१४११०१९	१४०१०१२

७	एकिकृत कृषि उत्पादनका लागि जग्गा चक्लावन्दी गरि एक वडा एक जैविक वगैचा कार्यक्रम-४	१०००००००	८७२३१९
८	एकिकृत कृषि उत्पादनका लागि जग्गा चक्लावन्दी गरि एक वडा एक जैविक वगैचा कार्यक्रम-५	१०००००००	९९४२८३
९	एकिकृत कृषि उत्पादनको लागि जग्गा चक्लावन्दी गरि एक वडा एक जैविक वगैचा कार्यक्रम	१०००००००	९९१२३६
१०	एकिकृत कृषि उत्पादनका लागि जग्गा चक्लावन्दी गरि एक वडा एक जैविक वगैचा कार्यक्रम-१	१०००००००	९९२३५७
११	एकिकृत कृषि उत्पादनका लागि जग्गा चक्लावन्दी गरि एक वडा एक जैविक वगैचा कार्यक्रम -खाल	१०००००००	९५९७०१
१२	एकिकृत कृषि उत्पादनका लागि जग्गा चक्लावन्दी गरि एक वडा एक जैविक वगैचा कार्यक्रम-किमपानी	१०००००००	८९३८८७
१३	पाञ्चायान मा.वि. पढ्दै कमाउँदै	१०००००००	९८५४३४

ठेक्का मार्फत कार्यान्वयनमा रहेका आ.व. २०७८/०७९ मा म्याद
थप भई आ.व. २०७९/०८० मा सम्पन्न भएका योजनाको विवरण

- १.कोट क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण तल्लो भाग
- २.झल्याकोट क्षेत्र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण
- ३.डिठ्ठापोखरा किमुखर्क द्वार्नेटा सडक
- ४.उदिना पिपलधारा नादी बर्बोट चौरासी सडक
- ५.मितेरी स्तम्भ निर्माण
- ६.बस्तु आयुर्वेद भवन मर्मत निर्माण

ठेक्का द्वारा कार्य गर्ने गरि सम्झौता भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका योजना विवरण

सि. न.	योजनाको नाम	वडा न.	लई रकम रु	कुल कबोल रु.	निर्माण फर्म/सम्झौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	कैफियत	
1	१५ शैया आधारभूत अस्पताल निर्माण	६	181393.484	133941287	रविना/अर्जुन/न्यू लिजा जे.भी.	2078/4/21	2080/02/15	म्याद थप हुन बाकी
2	प्रशासकीय भवन निर्माण	४	113940039	72396357	प्राकृतिक श्रेष्ठ/सुनिल/समिर जे.भि.	2078/03/23	2080/12/25	म्याद थप गरिएको
3	पनाहाखोला ठुल्दी प्रिस्टेस पुल निर्माण	१-४	51945880	39726111	अन्नजना/श्रेष्ठ जे.भी.		2080/12/25	म्याद थप गरिएको
4	ऐतिहासिक कोटक्षेत्र पूर्वाधार निर्माण तथा बूढीकोट पर्यटकीय क्षेत्र पैदल मार्ग	६	53562149	31368621	डुयागन-रेगन-रेसुङ्गा दर्शन	2078/06/25	2080/11/25	म्याद थप गरिएको

5	कोटक्षेत्र पूर्वाधार निर्माण /माथिल्लो भाग	६	8354706	5065284	तारालक्ष्मी /ममतामञ्जु जे.भी.	2078/02/09	2079/12/30	म्याद थप हुन वाकी
६	ओधोगिक ग्राम भौतिक पूर्वाधार निर्माण	४	11197151	5902192	मुडली कन्स्ट्रक्सन	2078/05/17	2080/02/25	म्याद थप हुन वाकी
7	धुर्कोट ऐतिहासिक दरवार पर्यटन पूर्वाधार निर्माण निर्माण	६		10632345	सजिता निर्माण सेवा	2079/11/10	2080/08/30	आ.व.०७९ /०८० को वहुवर्षीय

उ.स. मार्फत काम गर्ने गरी सम्झौता भएका वडागत योजना संख्या

वडा नं.	योजना सम्झौता संख्या
१	८७
२	५८
३	५३
४	७५
५	५८
६	६७
७	५५
जम्मा	४५३



गल्दा चरीखोला घाट सडक हाडहाडे





गल्दा चरीखोला घाट सडक हाडहाडे



विद्यालयको अनुगमनका क्रममा

शहिद शमसेर स्मृति भवनको अनुगमन



वडा न. ५ को वडा स्तरीय मोटरबाटो अनुगमन




मितेरी स्तम्भ धुर्कोट ४



शहिद पार्कमा बाघको शालिक राख्न स्थल पहिचान गर्दा तथा शालिक निर्माण पश्चात





धुर मा.वि. पर्खील अनुगमन

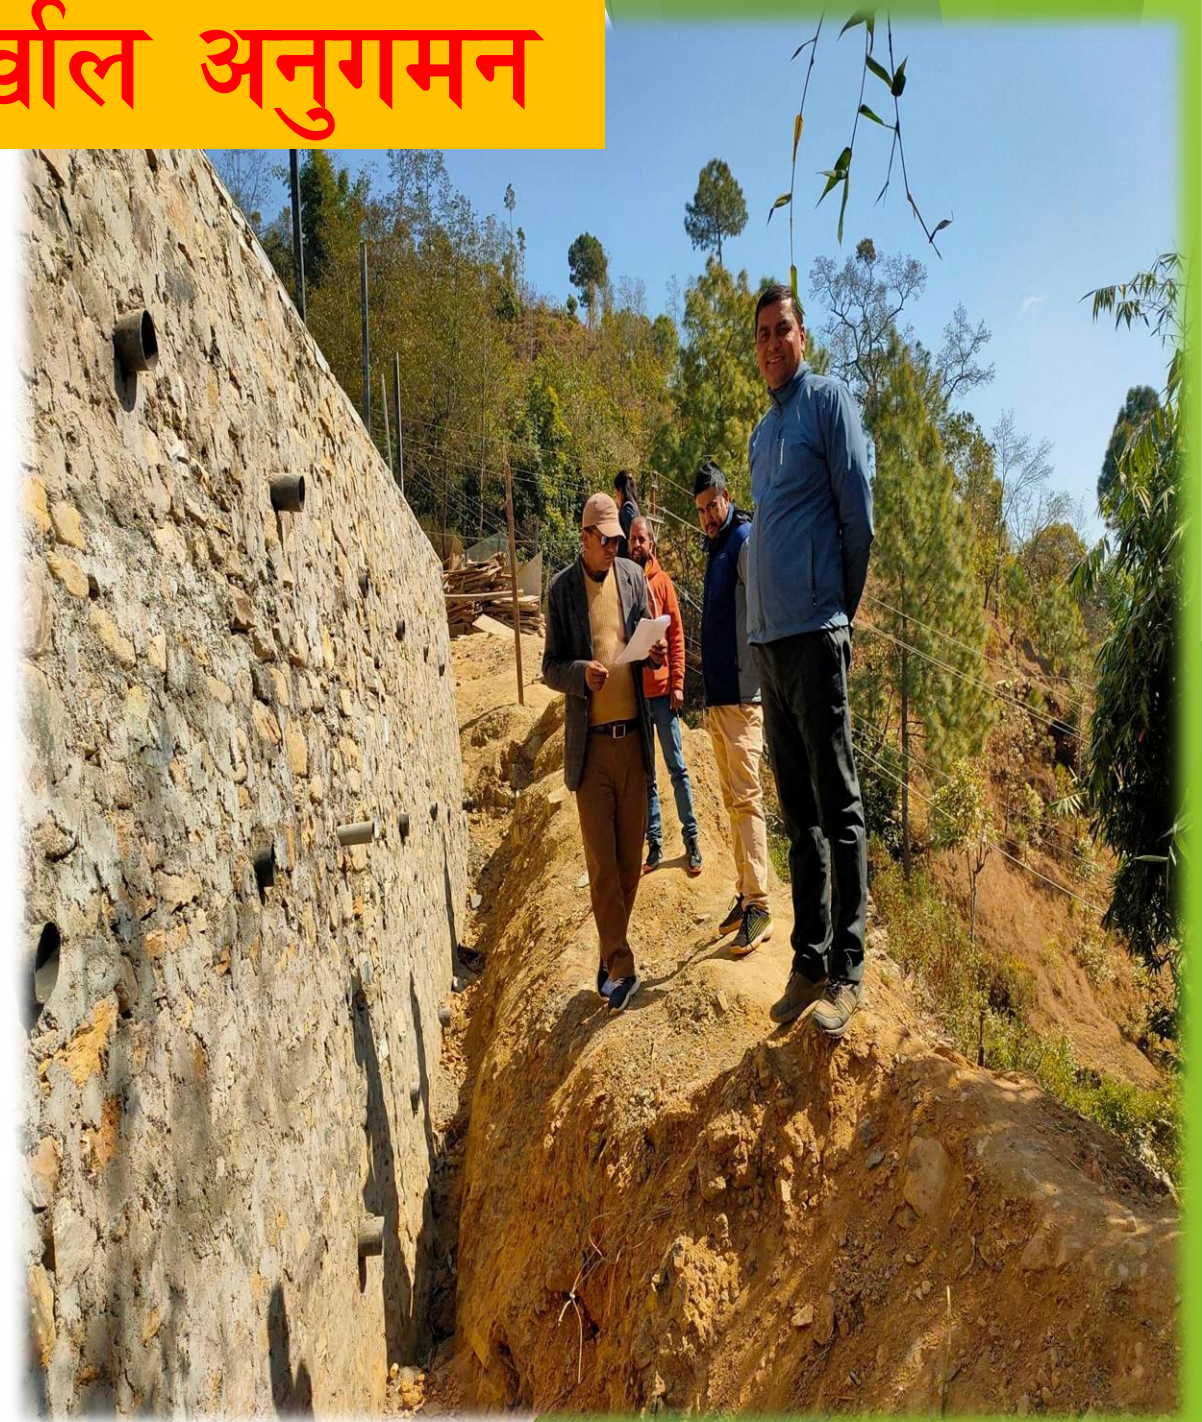


विष्णु स्मृति भवन वडा न. ४



बरारुख नादी सडक ग्राबेल

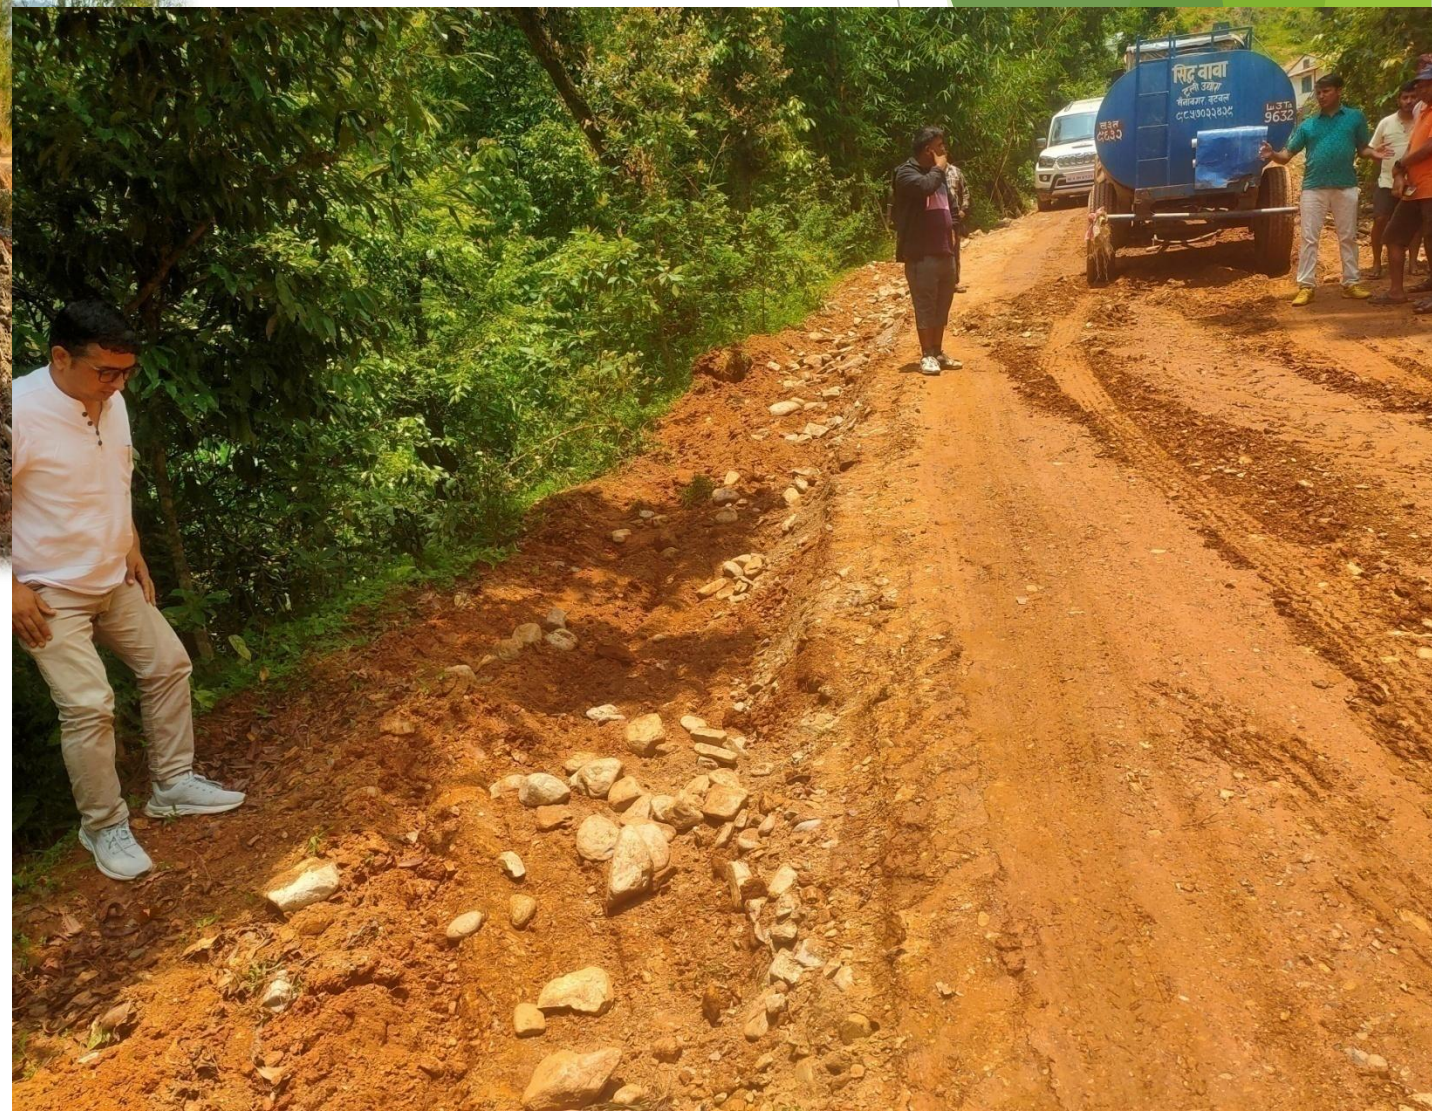
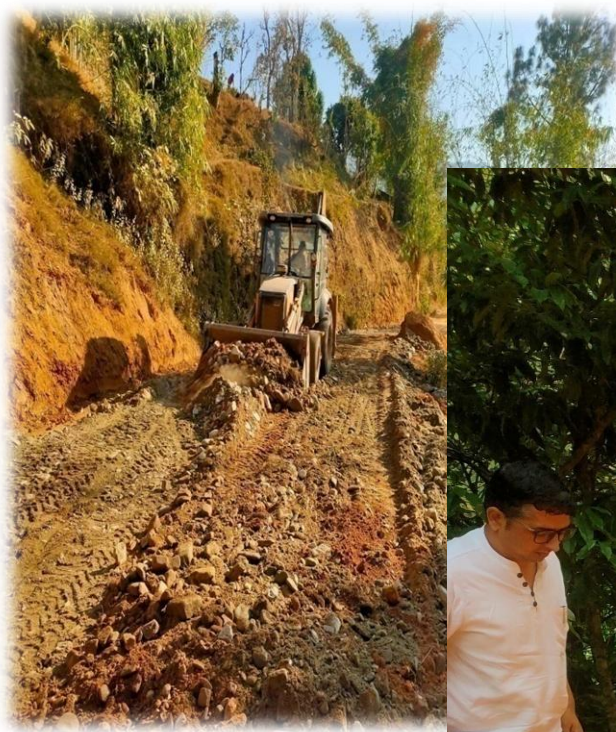


एतिहासिक धुर्कोट कोट क्षेत्रको अनुगमन

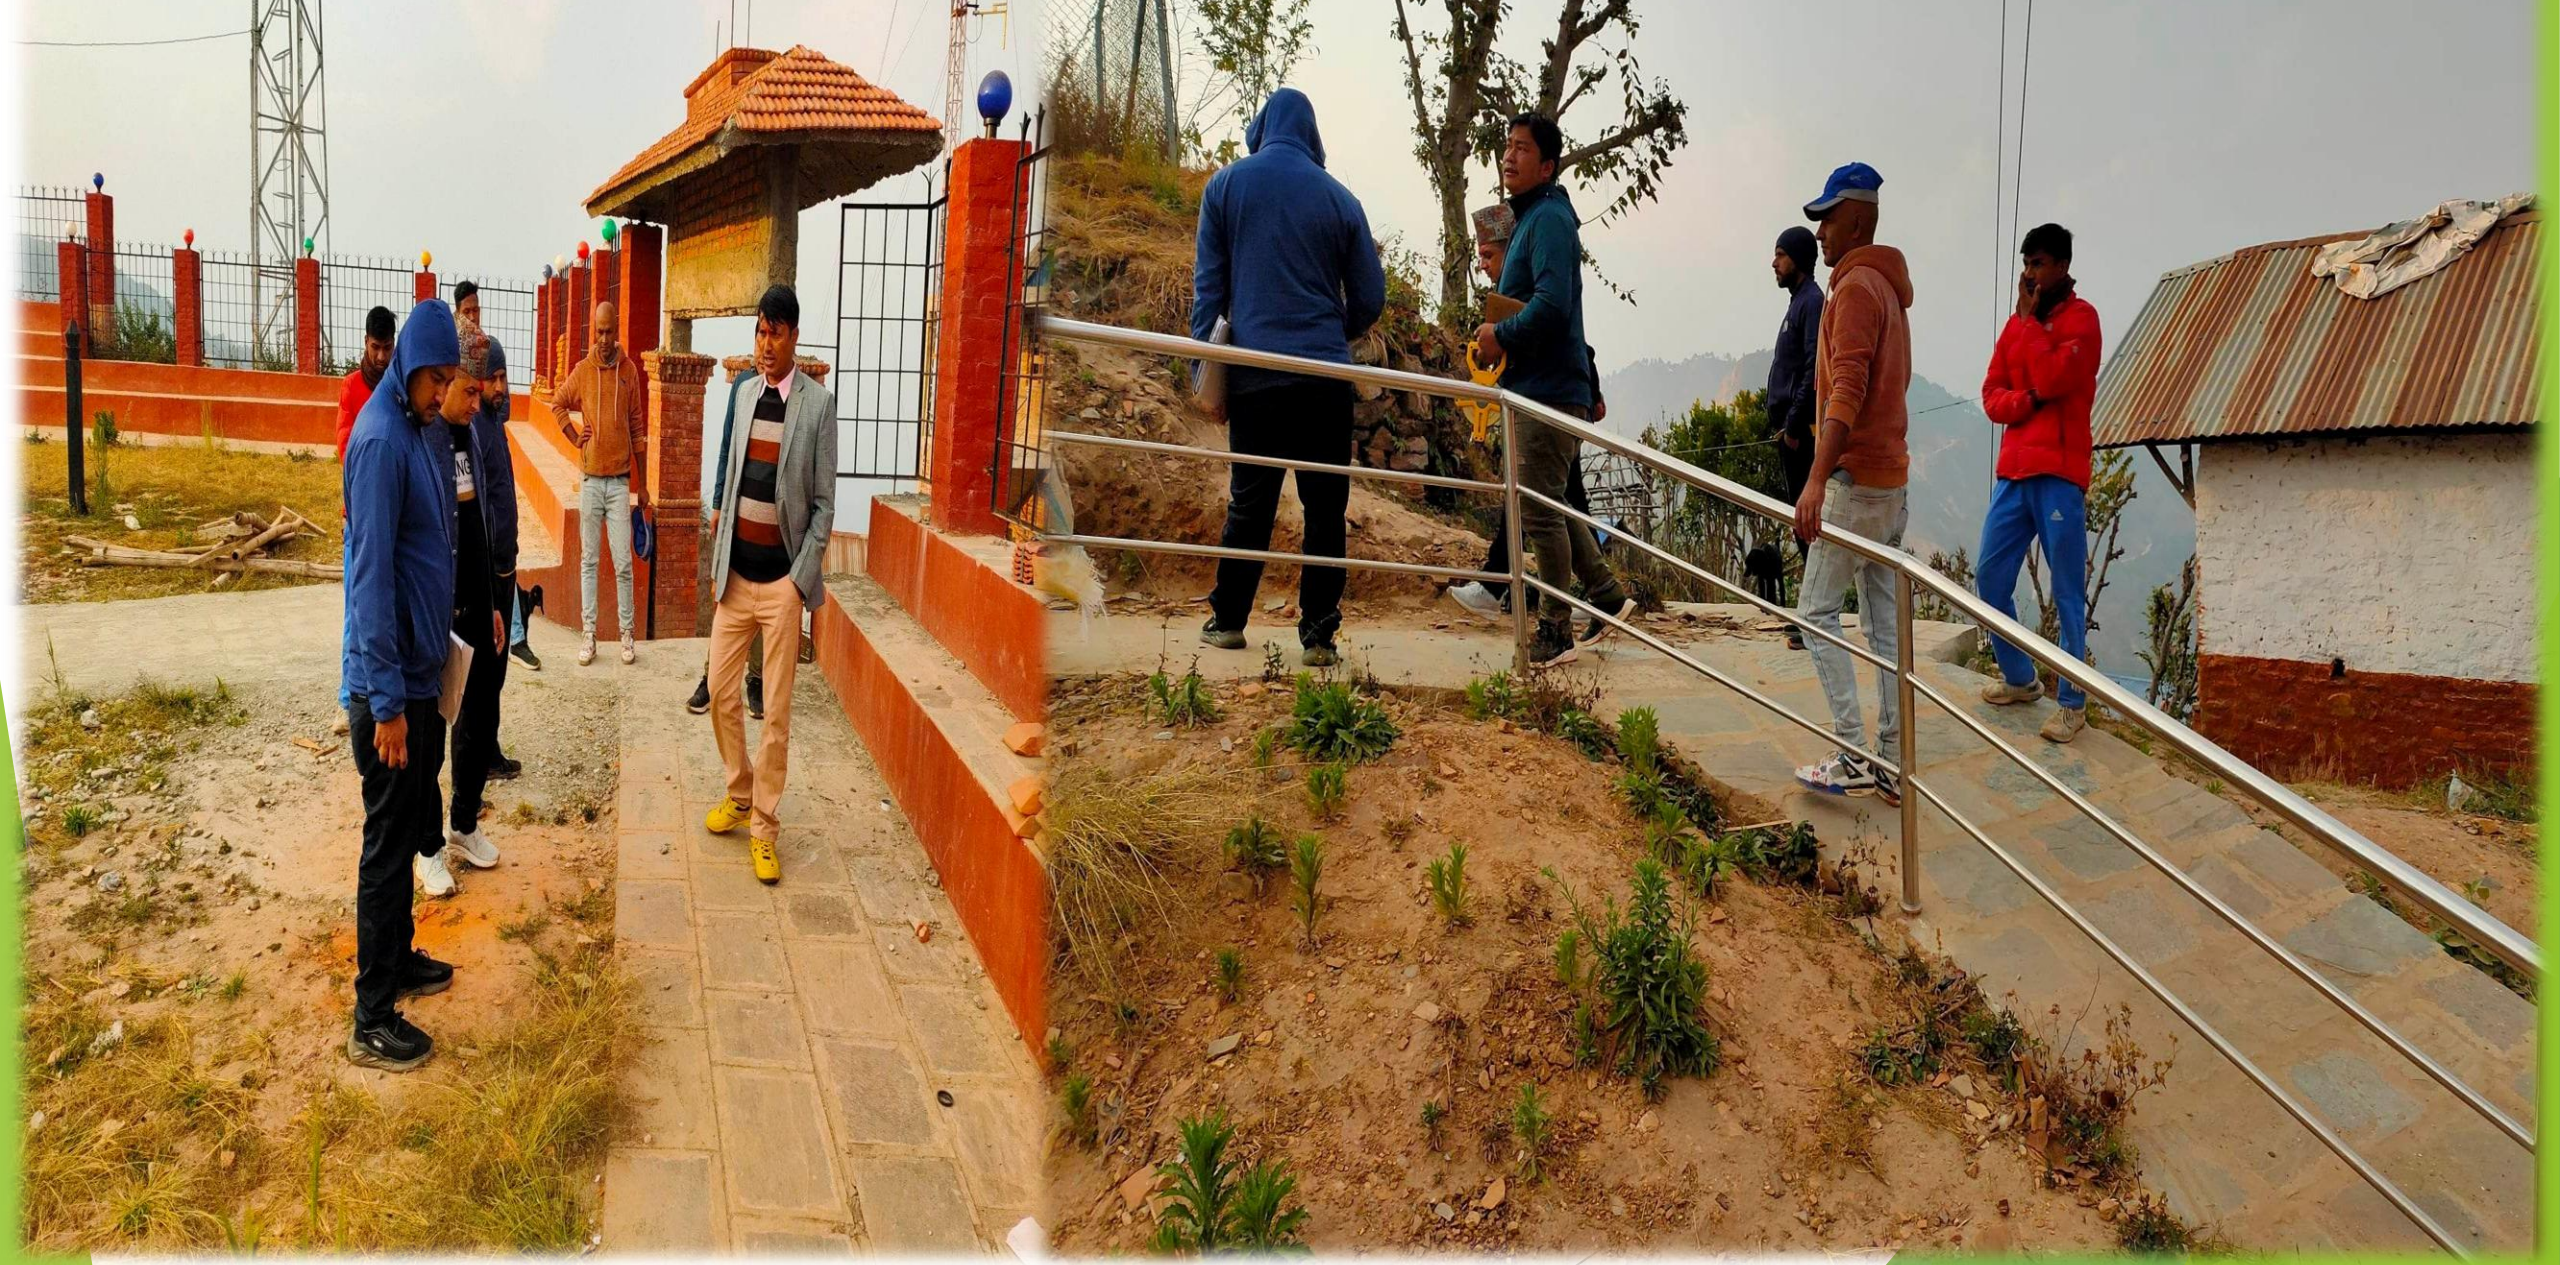



धुर्कोट बुढिकोट पैदल मार्ग अनुगमन

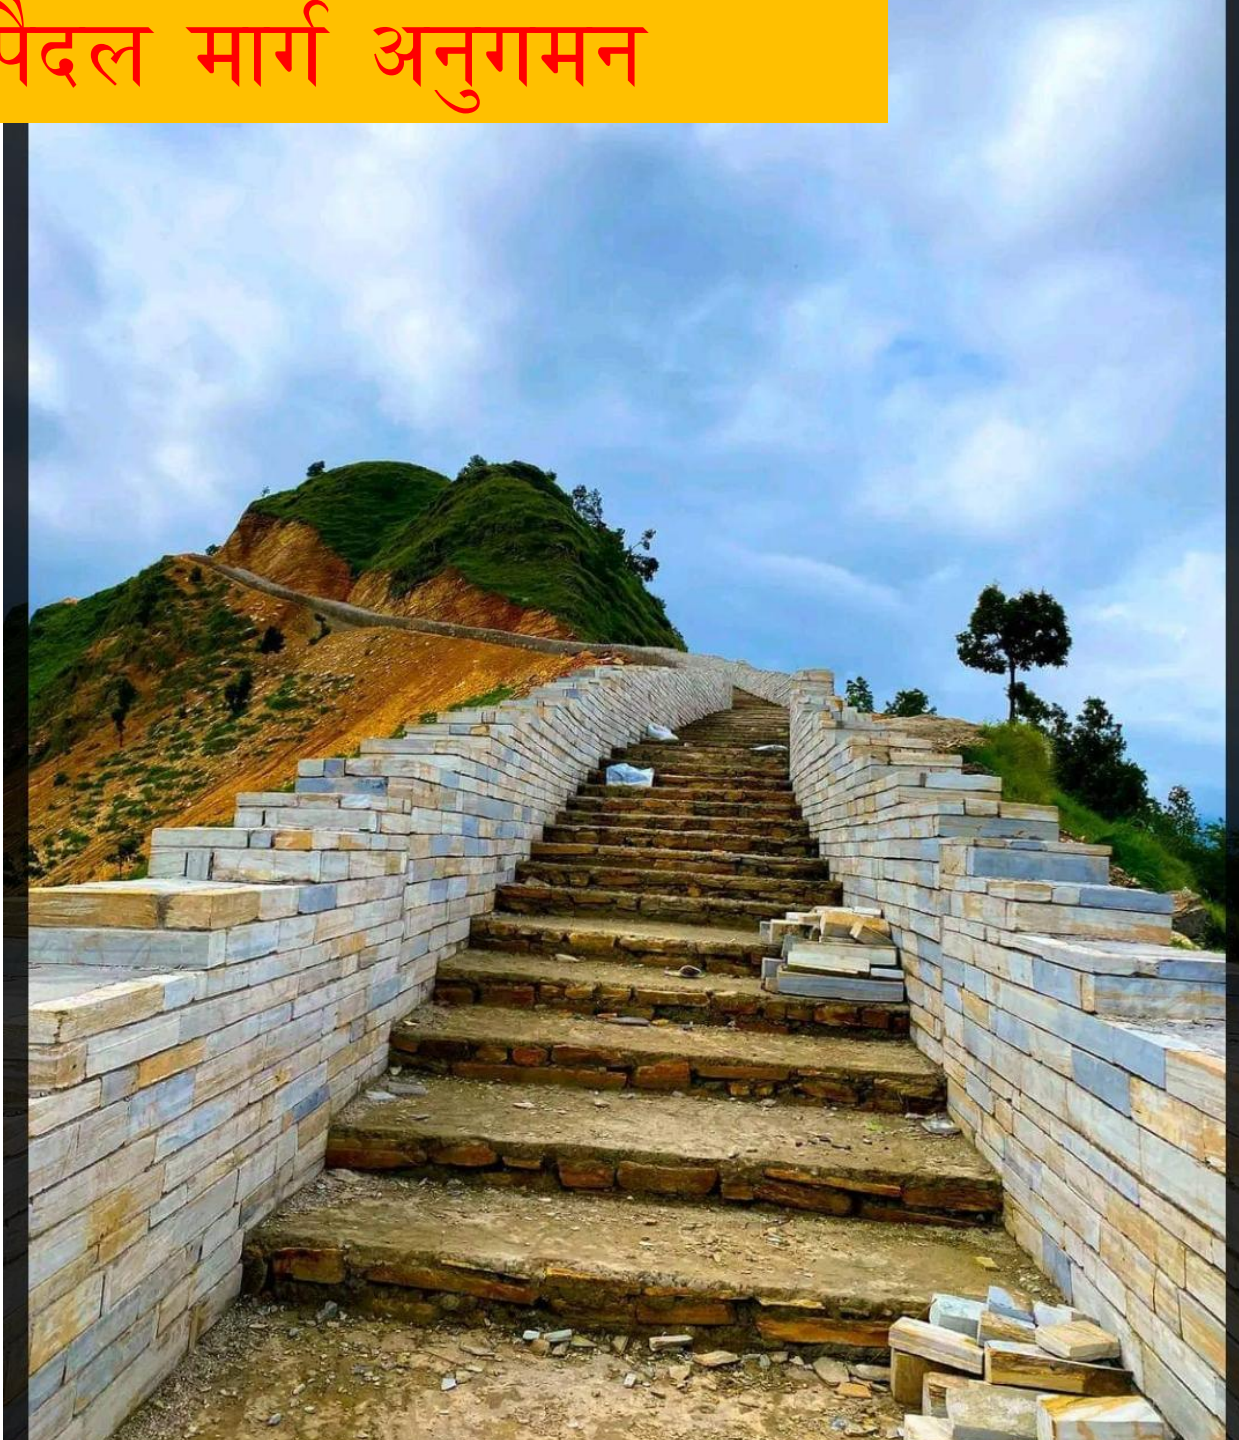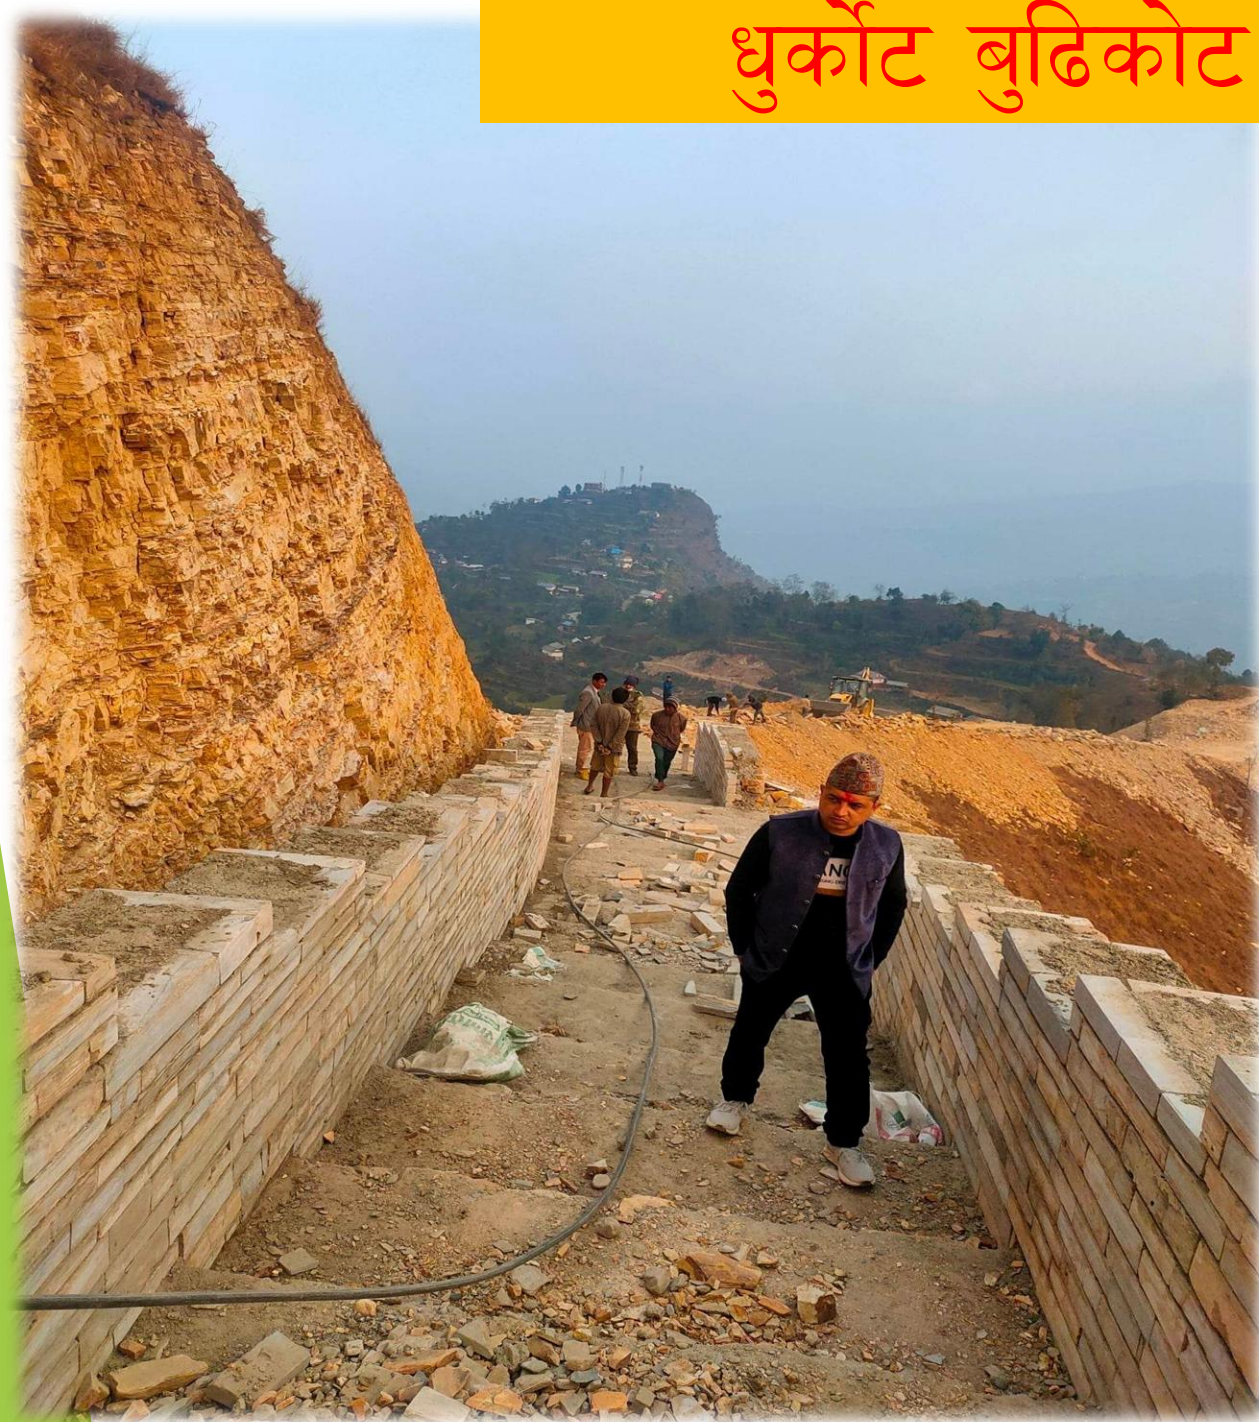


सुपादेउराली मन्दिर वडा न. १



झल्याकोट मन्दिर



झल्याकोट पैदलमार्ग

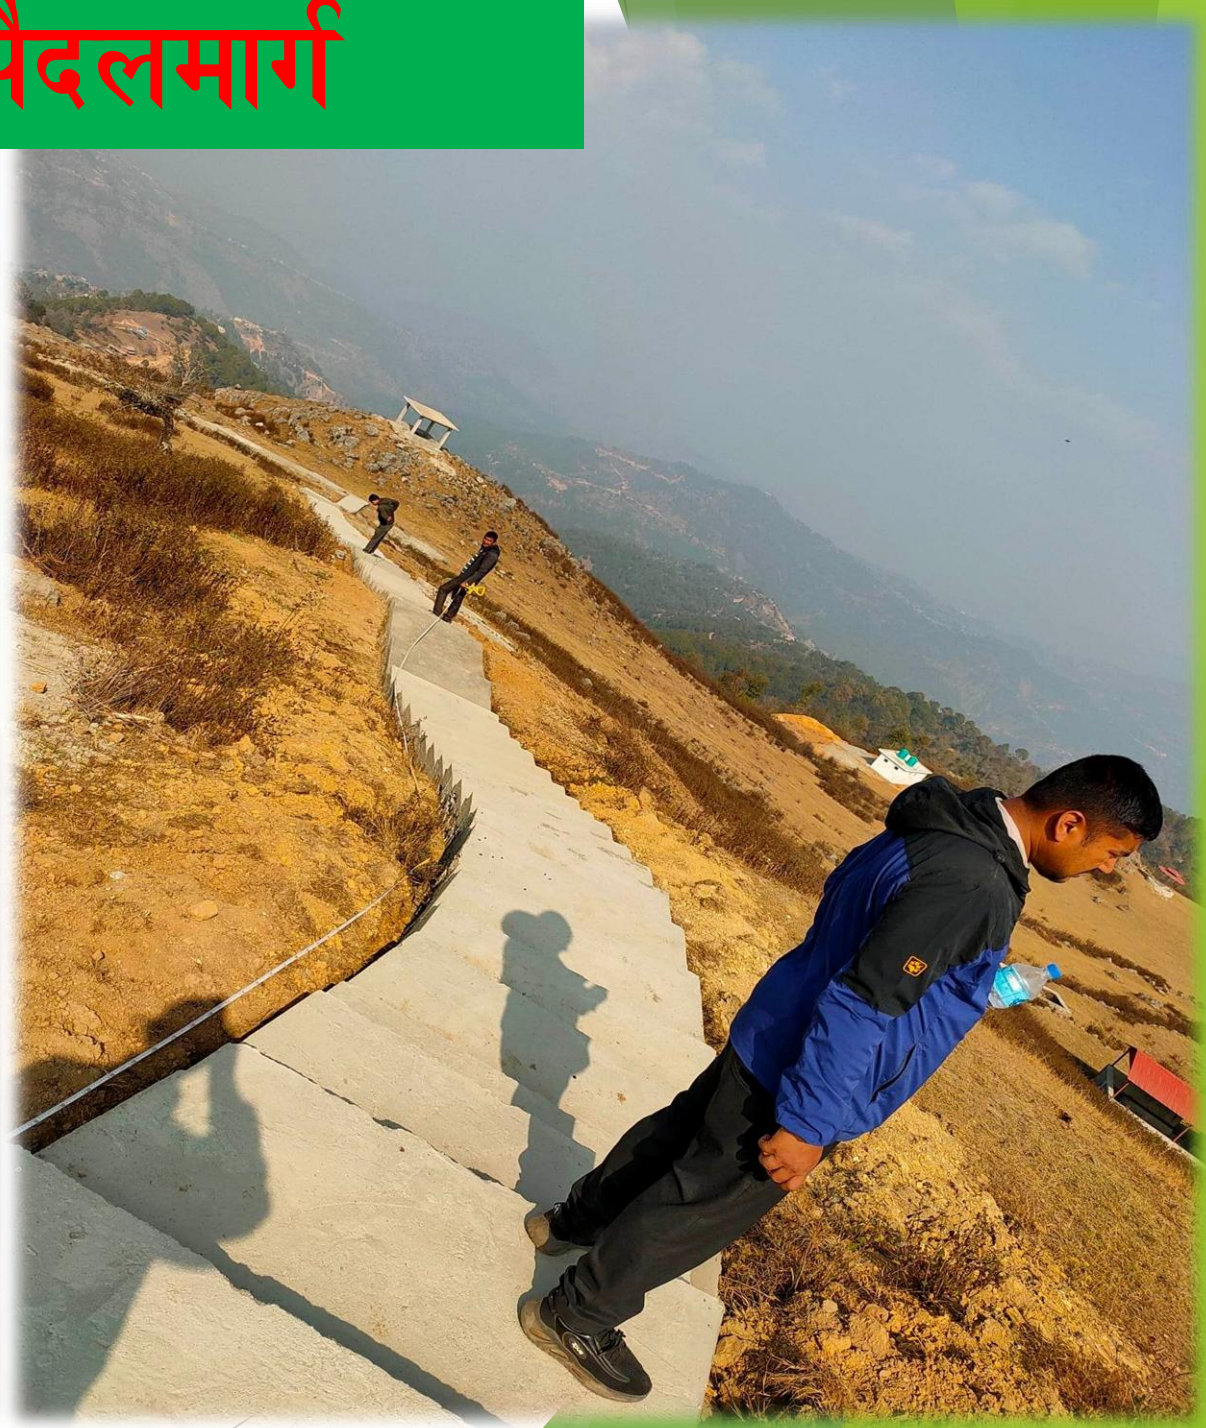


नयाँगाउ कृषि सडक



सडक ग्राभेल नयागाउँ




वडा कार्यलय भवन निर्माण वडा न. १

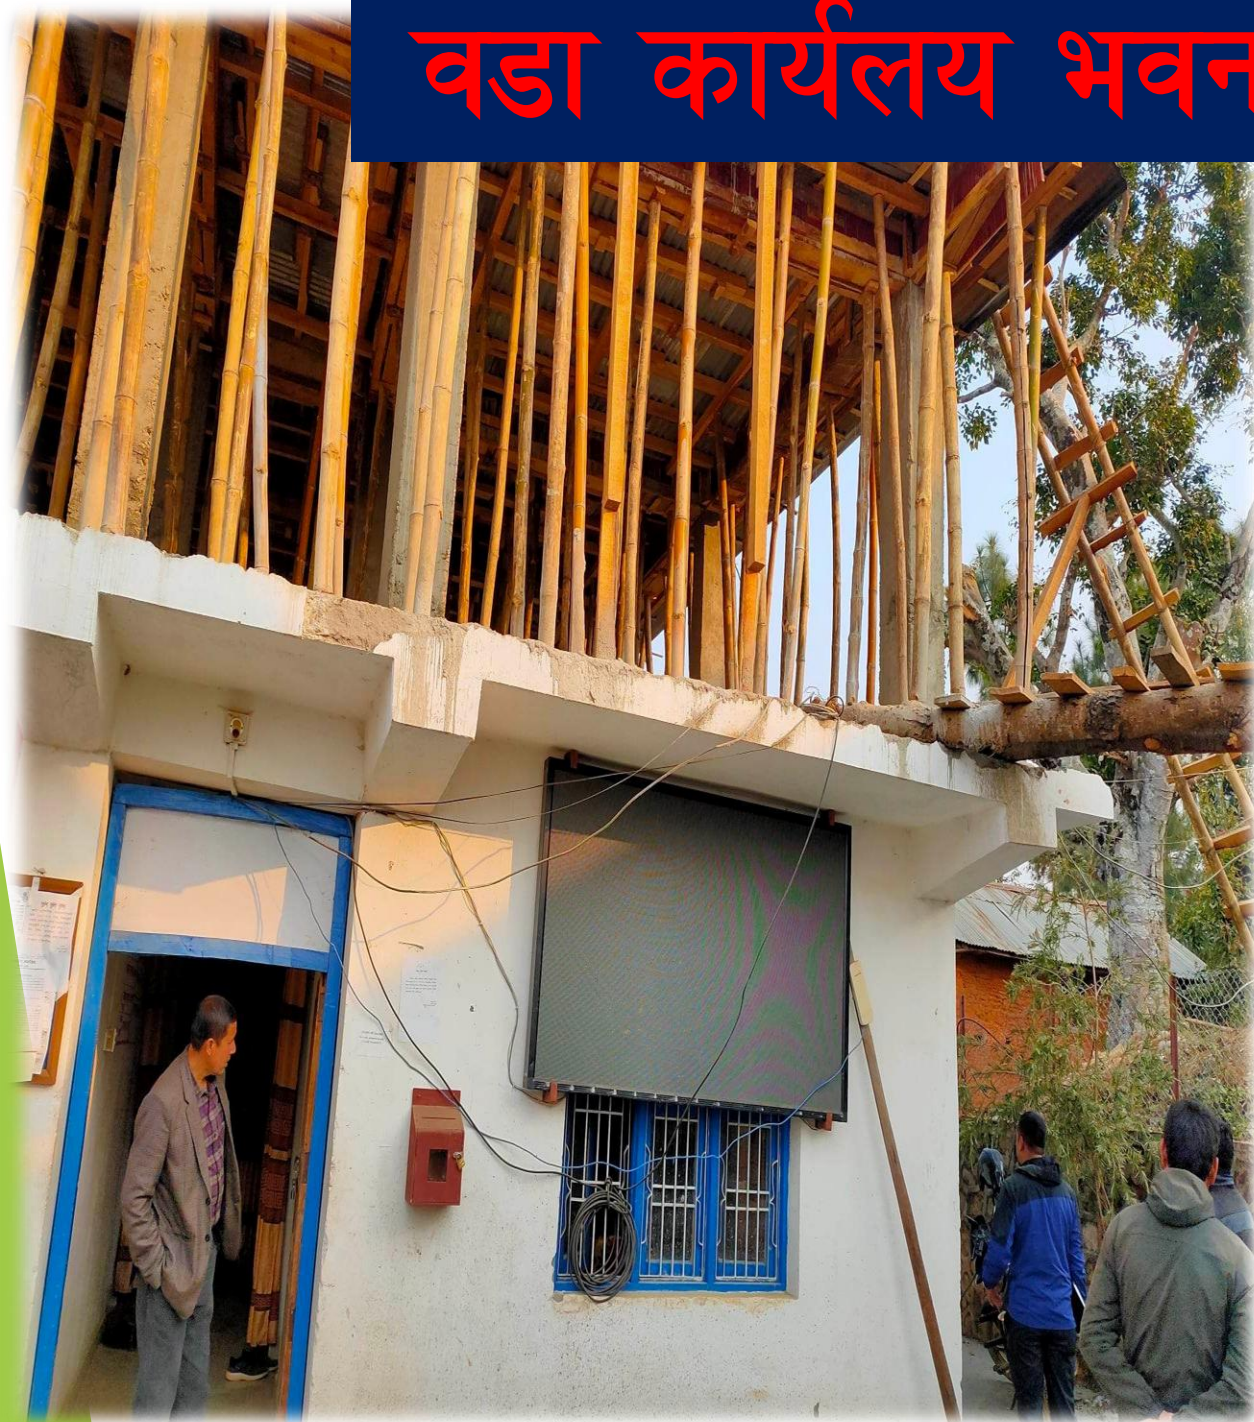



नयागाउँ कृषि फर्म थोपा सिचाइ

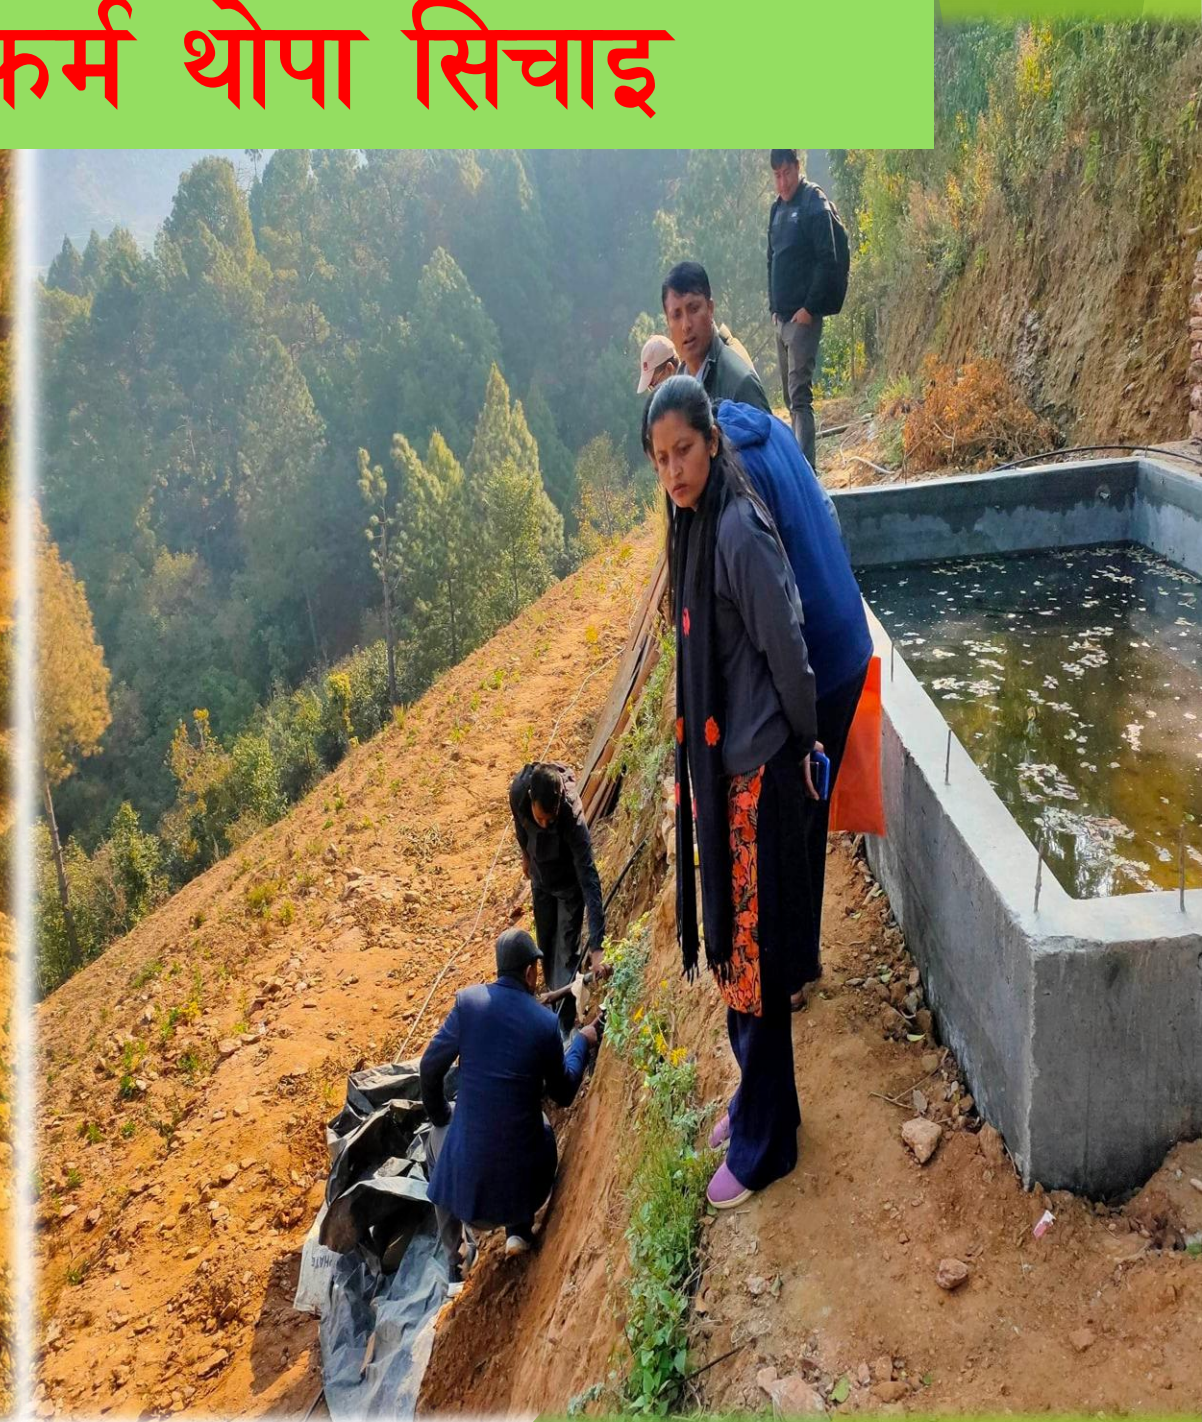

वडा नं. ३ हाडहाडे कभर्ड हल




पहर्दे कमाउर्दे पान्चायन मा.वि.



ज्ञानोदय मा.वि. पिपलधारा बालकक्षा



बडज्याङ सुफल सडक पिपलधारा

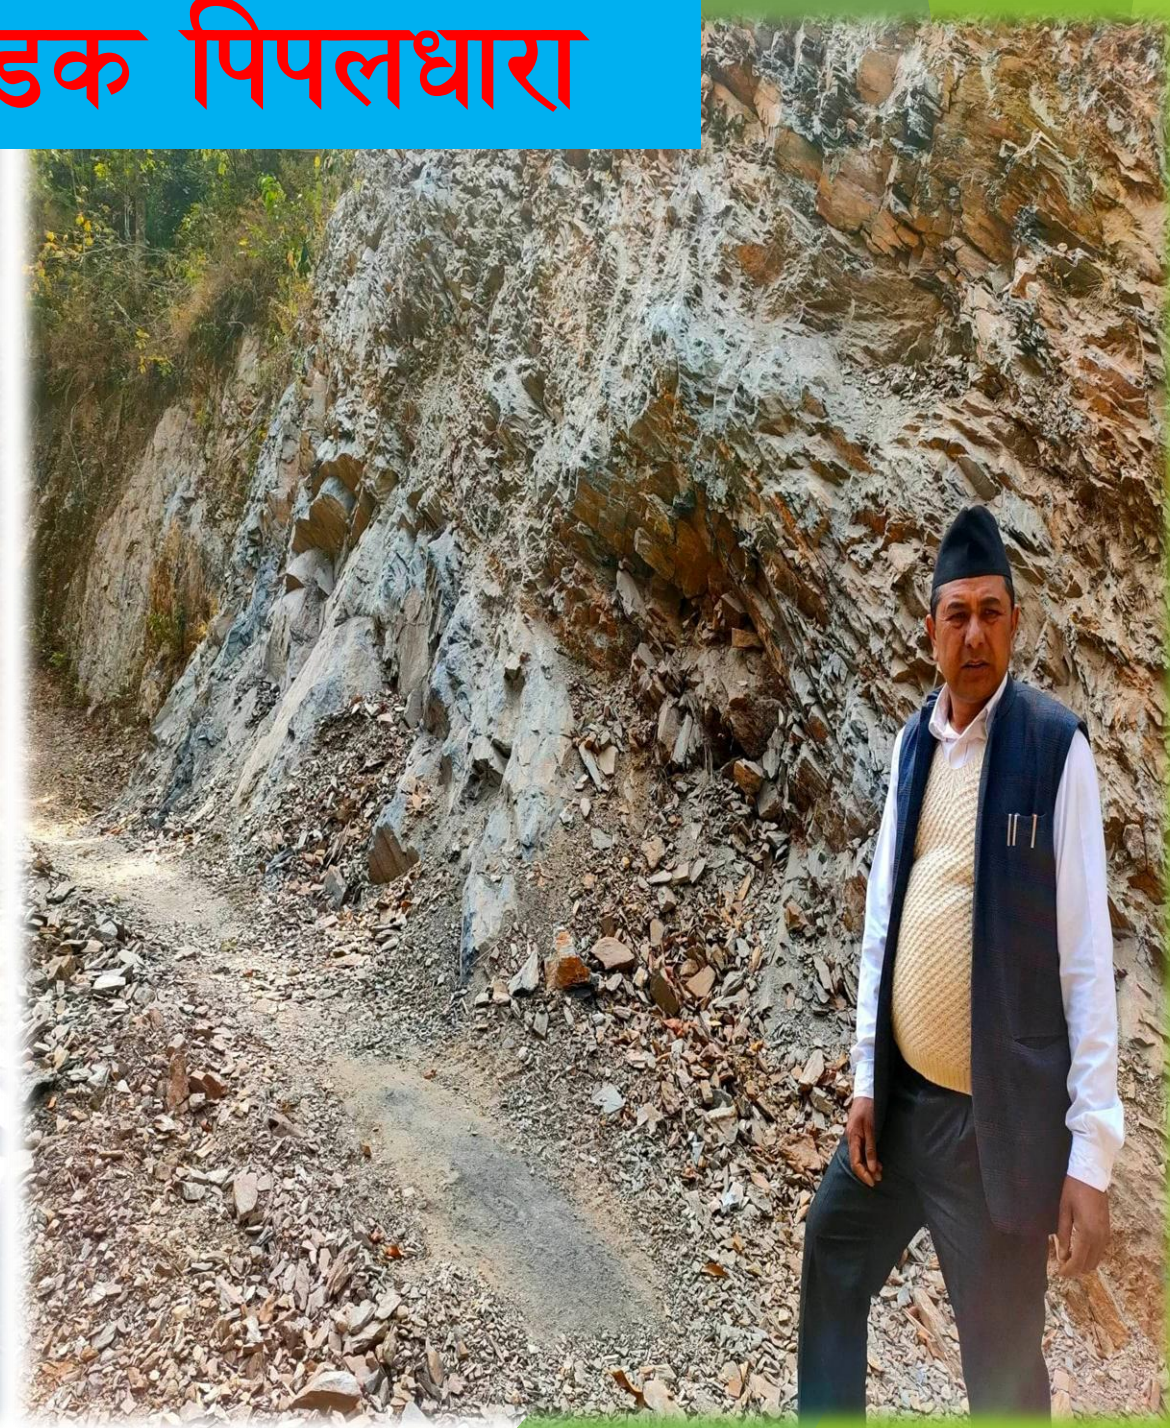

निन्युखर्क मा.वि. हाडहाडे निर्माण हुदै



निन्युखर्क मा.वि. भवन निर्माण पश्चात



इन्दिरा मा.वि. भवन निर्माण पश्चात



रातामाटा घोस सडक वडा न. ३



वडा नं.३ हाडहाडरे सोमरभोमर मा.वि.







कोट क्षेत्र पूर्वाधारको अनुगमन



सोमरभोमर आमा समुह पाहुना घर

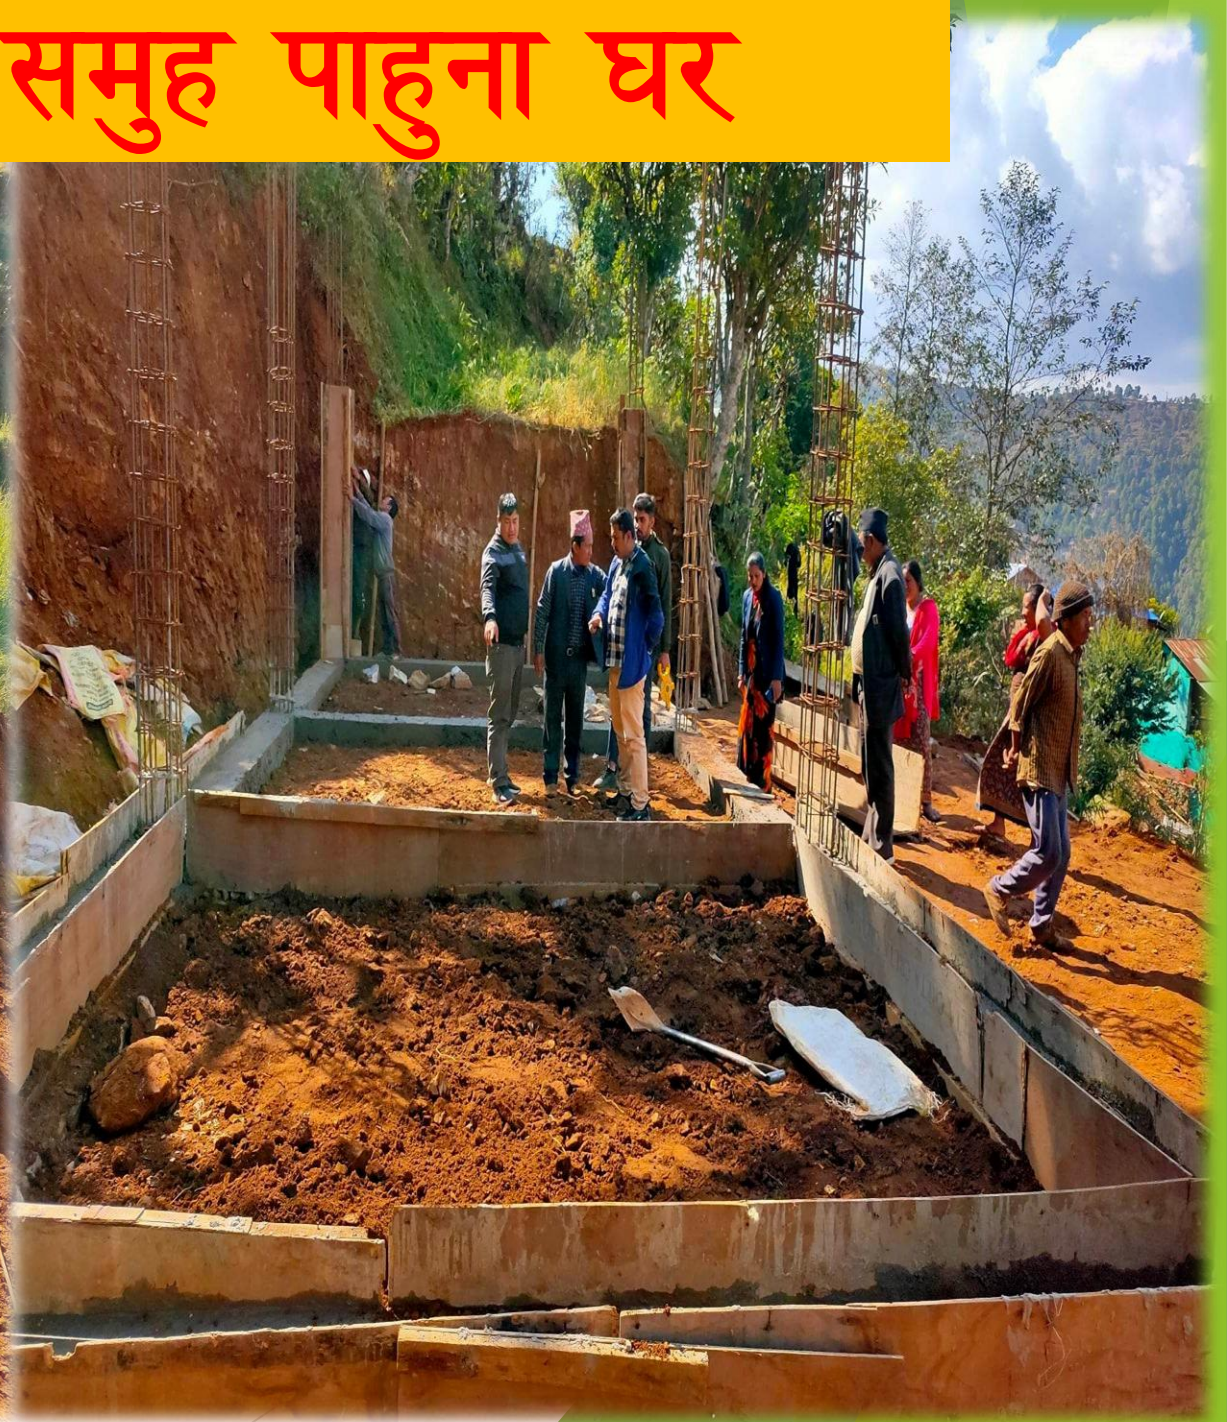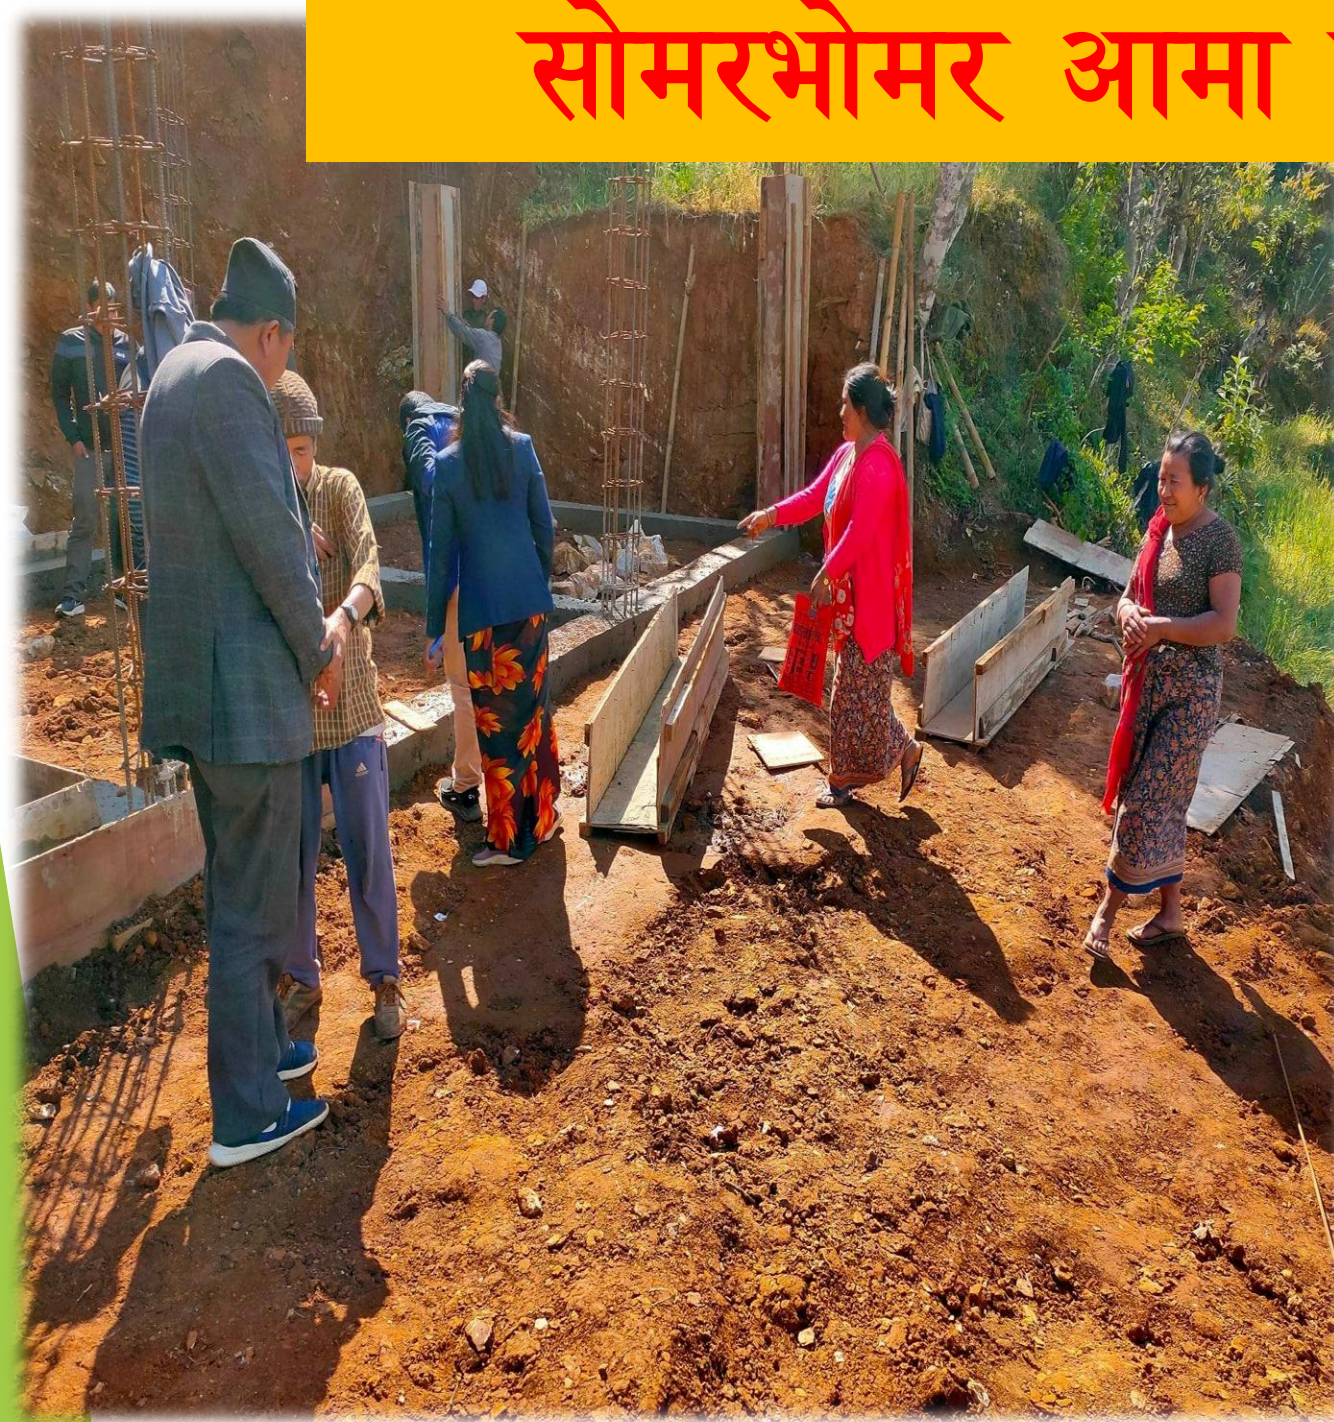

हाडहाडे मनकामना मन्दिर



झल्याकोट पर्यटन पूर्वाधार





सेउघा सिमाघाट बर्वोट कालोपत्रे सडक अनुगमन

डिठ्ठापोखरा किमुखर्क दानेटा गुफा सडक



पहिले



अहिले

ज्ञानोदय मा.वि. पिपलधाराको अनुगमन



धुर्कोट गाउँपालिकाको मध्यमकालिन खर्च संरचना निर्माण गर्दाको गोष्ठी कार्यक्रम



कुमारी देवि मन्दिरको पुननिर्माणको कार्य



विचित्र गुफा पूर्वाधार निर्माण धुर्कोट ५



धानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र धुर्कोट गा.पा.को लागत साझेदारीमा आ.व.
२०७८/०७९ मा वडा ७ वाग्लामा गरिएको चक्लाबन्दीको अनुगमन २०८०



आ.व. २०७९/०८० मा भुक्तानी भएका योजनाको संलग्न कागजातको आन्तरिक चेक जाँच गर्दाको समय



कुनै जिज्ञासा ?



धन्यवाद !

धुर्कोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बर्बोट, गुल्मी

आ.व. ०७९।८० को वार्षिक प्रगति समिक्षा

आर्थिक प्रशासन शाखा

प्रस्तोता

तेजेन्द्र थापा मगर (लेखापाल)

आम्दानी

क्र.सं.	बजेट शीर्षक	अनुमानित बजेट	आम्दानी	कैफियत
क) संघीय सरकार				
१	समानिकरण अनुदान	१०,७०,००,०००	९,८७,५०,०००	
२	ससर्त अनुदान	३२,६७,४८,०००	३१,७९,९७,०००.	
३	विशेष अनुदान	७०,००,०००	७०,००,०००.	
४	समपुरक अनुदान	४०,००,०००	४०,००,०००	
५	राजस्व बाँडफाँड	८,३८,४२,०००	६,७५,४७,४५२	
	कुल जम्मा	५२,८५,९०,०००	४९,५२,९४,४५२	

ख) प्रदेश सरकार

क्र.सं.	बजेट शीर्षक	अनुमानित बजेट	आम्दानी
१	समानिकरण अनुदान	५६,५६,०००	५६,५६,०००
२	ससर्त अनुदान	१,००,००,०००	१,००,००,०००
३	विशेष अनुदान	७८,००,०००	७८,००,०००
४	समपुरक अनुदान	१,५०,००,०००	१,३५,२५,९६८
५	राजस्व बाँडफाँड	६८,१७,०००	५०,७६,९६७
	कुल जम्मा	४,५२,७३,०००	४,२०,५८,९३५

ग)अन्य श्रोत

क्र.सं.	बजेट शीर्षक	अनुमानित बजेट	आम्दानी
१	आन्तरीक राजश्व	६०,००,०००।	५२,४३,११८
२	आन्तरीक राजश्व ढुङ्गा गिट्टी		२१,७१,९०४
३	गत वर्षको नगद मौज्दात	७,३४,००,०००।	७,३४,००,०००।
४	प्रशासकीय भवन	९५,००,०००।	९५,००,०००।
५	प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम	६४,००,०००।	५९,१४,५०३।
६	भाषा तथा संस्कृती	३०,००,०००।	२३,८६,८१७

चालु खर्च

क्र.सं.	शीर्षक	निकासा	खर्च रकम
१	संघीय समानिकरण अनुदान चालु	२,५७,७५,०००	२,२५,४३,०७७
२	संघीय ससर्त अनुदान चालु	२५,८७,८३,०००	२३,४९,२८,०७०
३	प्रदेश समानिकरण चालु	३५,५६,०००।	२२,६८,५४७
४	प्रदेश विशेष अनुदान चालु	६०,००,०००	५८,२९,४०१।
५	संघीय राजश्व वाँडफाँड	६,६०,४७,४५२	६,५५,७०,१५३
६	प्रदेश राजश्व वाँडफाँड	४५,७६,९६७	४१,८९,७७८
७	आन्तरिक राजश्व	४,४०,३०,५५१	३,८८,०२,९४५
जम्मा		४०,८७,६८,९७०	३७,४१,३१,९७१

पुजिगत खर्च

क्र.सं.	शीर्षक	निकासा	खर्च रकम
१	संघीय समानिकरण अनुदान	७,२९,७५,०००	६,९८,९०,०८८
२	संघीय समपुरक अनुदान	४०,००,०००	४०,००,०००
३	संघीय शर्सत अनुदान	५,९२,१४,०००	४,४२,१४,०००
४	संघीय विशेष अनुदान	७०,००,०००	६७,७३,५६४
५	संघीय राजश्व बाँडफाँड	१५,००,०००	१४,७६,१९६
६	प्रदेश समानिकरण	२१,००,०००	२०,५९,३८२

७	प्रदेश समपुरक अनुदान	१,३५,२५,९६८	१,३५,२५,०८८
८	प्रदेश विशेष अनुदान	१८,००,०००	१४,८६,६००
९	प्रदेश शर्सत अनुदान	१,००,००,०००	८७,३१,८२२
६	प्रदेश राजश्व बाँडफाँड	५,००,०००	२,६५,११०
७	आन्तरिक राजश्व	२,९८,५०,६४४	२,९७,९४,९००
जम्मा		२०,२४,६५,६१३	१८,२२,१६,७५०

खर्च विवरण वडागत (चालु र पूँजिगत समेत)

क्र.सं.	वडा नं.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	वडा नं. १ नयाँगाउँ	८९.८१	
२	वडा नं. २ पिपलधारा	९१.७४	
३	वडा नं. ३ हाडहाडे	९२.७	
४	वडा नं. ४ जैसिथोक	८७.९३	
५	वडा नं. ५ वस्तु	८८.८	
६	वडा नं. ६ रजस्थल	८२.१	
७	वडा नं. ७ वाग्ला	८४.३८	

खर्च विवरण प्रतिशतमा

चालु खर्च	पूँजिगत खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
९१.५३%	८९.९८%	९०.७५%	



Thank You
